BAC
USD 480 mil

PV
USD 227 mil

EV
USD 106 mil

AC
USD 106 mil

Variación del costo (CV)
USD 0

Variación del plazo (SV)
-USD 121 mil

CPI
1,00

SPI
0,47


TCPI
1,00

EAC
USD 480 mil


ETC
USD 374 mil

VAC
USD 0


% avance real y % avance planificado

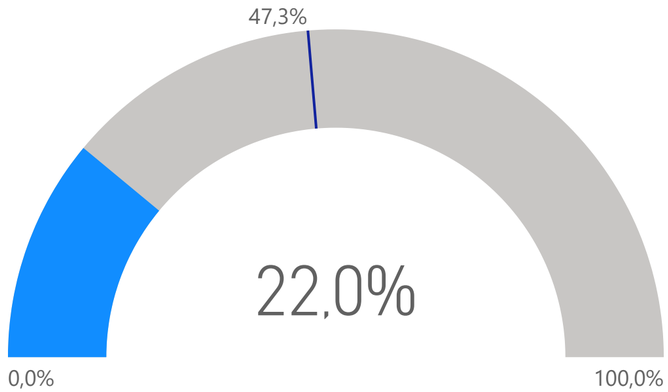


EV, PV y AC

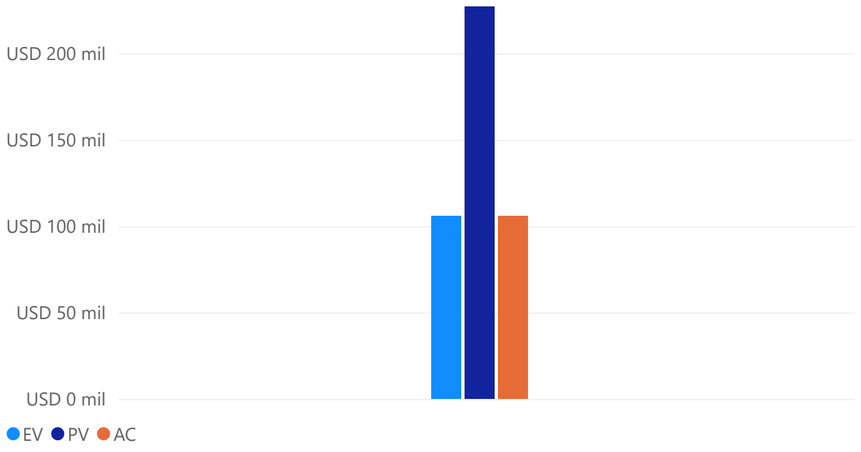

Resumen ejecutivo. Proyecto de ejemplo con datos ficticios. Indicadores de valor ganado (EVM) con el estado de costo y cronograma: BAC, PV, EV, AC, CPI, SPI, EAC y ETC. El medidor compara el avance real con el planificado.

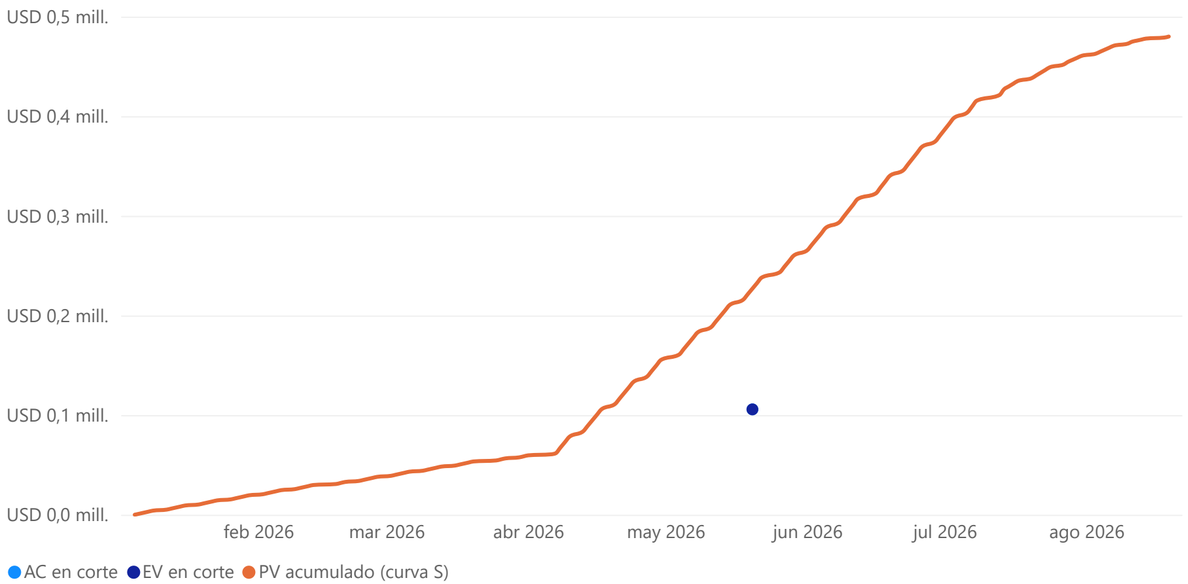



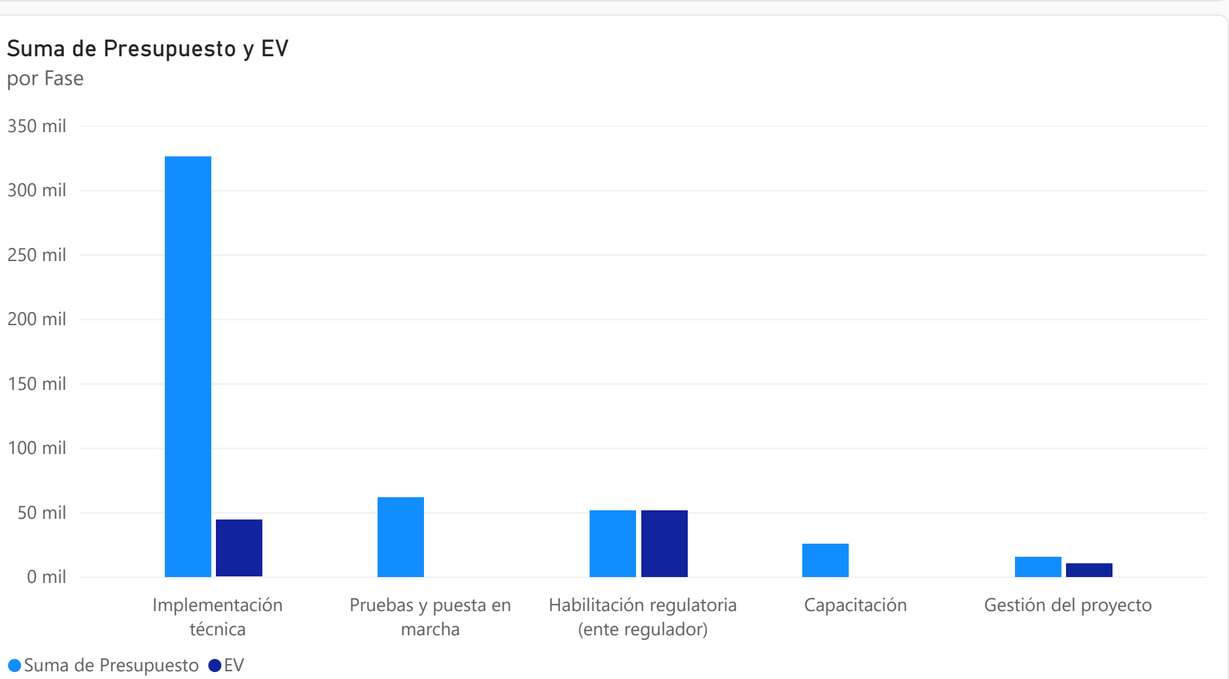

Costos y curva S. Proyecto de ejemplo con datos ficticios. La curva S muestra el valor planificado acumulado (PV) contra el valor ganado (EV) y el costo real (AC) en la fecha de corte. CPI y SPI por debajo de 1 indican sobrecosto y atraso respectivamente. El gráfico de barras compara presupuesto y valor ganado por fase.

EDT	Fase	Tarea	Fecha de inicio	Fecha de fin	Desvío del fin (días)	Estado de ruta	Avance (%)	Holgura (días)
152	Capacitación	Capacitación a operadores	19-06-2026	13-07-2026	0	Con holgura	0	20
151	Capacitación	Manual de operaciones	04-06-2026	18-06-2026	0	Con holgura	0	20
111	Gestión del proyecto	Acta de constitución y planificación	05-01-2026	16-01-2026	0	Crítica	100	0
113	Gestión del proyecto	Cierre del proyecto	11-08-2026	18-08-2026	0	Crítica	0	0
122	Habilitación regulatoria (ente regulador)	Aprobación del ente regulador	18-02-2026	06-04-2026	0	Crítica	100	0
121	Habilitación regulatoria (ente regulador)	Presentación ante el ente regulador	19-01-2026	13-02-2026	0	Crítica	100	0
132	Implementación técnica	Config. dashboard central	07-04-2026	03-06-2026	0	Con holgura	10	20
131	Implementación técnica	Instalación de sensores (18 pozos)	07-04-2026	02-07-2026	0	Crítica	20	0
133	Implementación técnica	Integración con ERP actual	04-06-2026	13-07-2026	0	Con holgura	0	20
142	Pruebas y puesta en marcha	Go-live escalonado	28-07-2026	10-08-2026	0	Crítica	0	0
141	Pruebas y puesta en marcha	Pruebas por pozo	03-07-2026	27-07-2026	0	Crítica	0	0
1449			**11-08-2026**	**18-08-2026**	**0**		**330**	**80**

Fase


- [ ] Capacitación
- [ ] Gestión del proyecto
- [ ] Habilitación regulatoria (ente regulador)
- [ ] Implementación técnica
- [ ] Pruebas y puesta en marcha

EstadoRuta

- [ ] Con holgura
- [ ] Crítica

Tareas críticas

por Fase

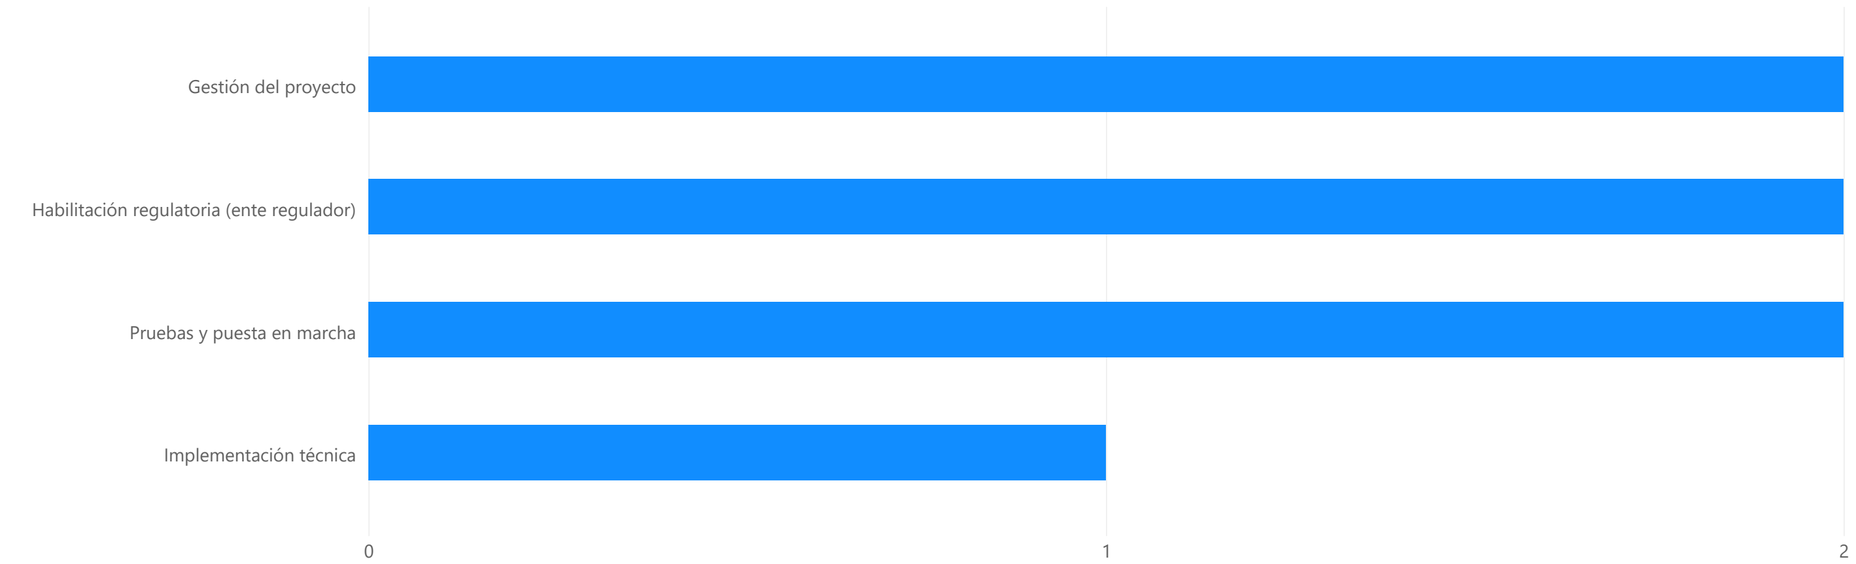

Riesgos y control. Proyecto de ejemplo con datos ficticios. Registro de riesgos con probabilidad, impacto, puntaje y responsable, y matriz probabilidad por impacto.

Riesgos abiertos

3

Riesgos altos (puntaje mayor a 4)

3

ID	Categoria	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Puntaje	Responsable
R1	Externo	Media	Alta	El proveedor de integración no cumple los plazos comprometidos	6	PM
R2	Organizacional	Alta	Alta	Resistencia al cambio en sucursales con procesos manuales arraigados	9	PM
R3	Técnico	Media	Alta	El ERP actual no soporta integración vía API sin desarrollo adicional	6	Gerente Sistemas
Total					**21**	

Probabilidad	Alta	**Total**
Alta	1	**1**
Media	2	**2**
Total	**3**	**3**
